Sprint Planning S2

Planeamento da Sprint 2 do Projeto de Laboratório III, com base na Sprint Retrospective da S1 (19/10/2026) e no levantamento de requisitos.

- ✅ Lista de verificação de planeamento do sprint
- 👥 Membros da equipe do sprint
- ✏️ Itens da reunião de planeamento do sprint
  - Agenda
  - Resumo do sprint anterior
  - Detalhes
  - Possíveis riscos
- 📚 Recursos de planeamento do sprint
  - Quadros e retrospetivas de sprint
  - Recursos e definições da equipe

✅ Lista de verificação de planeamento do sprint

Preparação	Reunião	Acompanhamento
☐ Retrospetiva da S1 revista e ações de melhoria definidas ☐ Requisitos (RF/RNF) revistos ☐ Product Backlog organizado no Trello, com IDs de requisitos ☐ User stories escritas com critérios de aceitação	☐ Definir a meta do sprint ☐ Estimar os itens com planning poker ☐ Escolher os itens do Sprint Backlog (separado do Product Backlog) ☐ Distribuir tarefas de forma equilibrada	☐ Fixar a meta do sprint no Trello ☐ Mover os cards para o Sprint Backlog e atualizar o estado diariamente ☐ Rever as estimativas a meio do sprint ☐ Preparar a retrospetiva da S2

👥 Membros da equipe do sprint

Nome	Função
Simão (1241597)	Developer
Guilherme (1251657)	Developer
Dinis (1251652)	Team Leader
Leonardo (1251663)	Developer

✏️ Itens da reunião de planeamento do sprint

Use este template para estruturar a reunião e definir expectativas, objetivos e o backlog para o próximo sprint. Para ver instruções detalhadas e práticas recomendadas, consulte o guia de planeamento de sprint e analise como estimar pontos da história.

Resumo do sprint anterior

Tema do sprint	Sprint 1 – Levantamento de requisitos (análise do enunciado)
Pontos da história	Não estimados na S1 (ação de melhoria: estimar todos os itens a partir da S2)
Resumo	Foi produzido o documento de requisitos do Hotel4You, com 40 requisitos funcionais por ator, 15 requisitos não funcionais, 10 dúvidas (D1–D10) e 5 assunções (A1–A5) para apresentar ao docente. Na retrospetiva de 19/10/2026 a equipa identificou que as estimativas foram esquecidas, que o Sprint Planning não deve ficar no Product Backlog e que o Trello precisa de ser organizado. Ficaram por fazer a estrutura MVC, a base de dados e a revisão dos diagramas UML (casos de uso, domínio, classes e sequência).

Agenda

ID	User story e critérios de aceitação	Prioridade	Responsável
S2-01	Como equipa de desenvolvimento, quero uma estrutura de projeto em MVC com pacotes separados, para que a lógica de negócio fique isolada da interface e seja simples acrescentar funcionalidades nas próximas sprints. **Critérios de aceitação** ☐ Existem os pacotes model, view, controller, dao e utils, e uma classe Main que arranca a aplicação ☐ O pacote model não tem dependências de view nem de controller ☐ A View só comunica com o Controller; o Controller usa o Model e os DAO ☐ As classes base têm Javadoc ☐ A aplicação compila e arranca no menu inicial sem erros	Alta	Simão
S2-02	Como utilizador, quero que a aplicação valide e leia as minhas entradas de forma consistente em todos os menus, para não encontrar comportamentos diferentes de ecrã para ecrã. **Critérios de aceitação** ☐ Todos os menus usam Utils.lerCampo() e Utils.lerInteiro() para ler dados ☐ Entradas inválidas apresentam mensagem de erro e pedem nova introdução ☐ O input “0” cancela o registo em qualquer formulário ☐ Não existem métodos lerData() ou lerInteiro() duplicados em diferentes Views ☐ As validações de Utils têm testes unitários	Média	Dinis
S2-03	Como equipa de desenvolvimento, quero um modelo de domínio e um diagrama de classes alinhados com a estrutura MVC, para que o código das próximas sprints siga um desenho comum. **Critérios de aceitação** ☐ O modelo de domínio inclui utilizador, quarto, reserva, cliente, cartão, passagem de cartão, extras/serviços e stock ☐ O diagrama de classes distingue model, controller e DAO ☐ As classes implementadas nesta sprint correspondem ao diagrama ☐ Os diagramas foram revistos por outro elemento e as fontes estão referenciadas ☐ As dúvidas D1–D10 que afetam o modelo estão registadas como assunções	Média	Dinis
S2-04	Como equipa de desenvolvimento, quero uma camada de acesso a dados ligada ao SQL Server, para que os dados fiquem guardados de forma persistente sem o resto da aplicação depender de SQL. **Critérios de aceitação** ☐ Existe um script SQL que cria a base de dados Hotel4You e as tabelas iniciais ☐ A ligação é feita numa só classe, com a configuração fora do código (sem credenciais no repositório) ☐ Existe uma interface DAO base que os DAO seguintes implementam ☐ Se a ligação falhar, é apresentada uma mensagem de erro e a aplicação não fecha de forma abrupta ☐ Todos os elementos da equipa conseguem correr o script no seu ambiente	Alta	Leonardo

ID	User story e critérios de aceitação	Prioridade	Responsável
S2-05	Como gestor, quero que o sistema guarde todos os utilizadores com o respetivo perfil e palavra-chave encriptada, para os poder consultar a qualquer momento sem expor dados críticos. **Critérios de aceitação** ☐ Existem os perfis Rececionista, Gestor, Empresa de restauração e Fornecedor ☐ As palavras-chave são guardadas encriptadas (hash) e nunca em claro ☐ É possível consultar qualquer utilizador guardado ☐ Existe um utilizador gestor inicial no script SQL ☐ O model e o DAO de utilizadores têm testes unitários	Alta	Leonardo
S2-06	Como utilizador, quero fazer login com utilizador e palavra-chave, para aceder às funcionalidades do meu perfil. **Critérios de aceitação** ☐ O ecrã de login é uma View que usa um LoginController e o DAO de utilizadores ☐ Credenciais inválidas mostram mensagem de erro e permitem nova tentativa ☐ O input “0” sai do login ☐ A palavra-chave nunca é mostrada nem comparada em claro ☐ Após login com sucesso, o utilizador fica associado ao seu perfil	Alta	Simão (com Guilherme)
S2-07	Como utilizador autenticado, quero ver apenas as opções do meu perfil, para não aceder a funcionalidades ou zonas que não me pertencem. **Critérios de aceitação** ☐ O rececionista não vê opções de gestor ☐ O gestor vê as opções do rececionista e as suas ☐ O utilizador da empresa de restauração só vê o que respeita à cozinha/restaurante ☐ Opções ainda não implementadas mostram “em desenvolvimento” ☐ Terminar sessão volta ao login	Média	Guilherme
S2-08	Como gestor, quero criar funcionários e atribuir-lhes um perfil, para que a equipa do hotel possa aceder ao sistema. **Critérios de aceitação** ☐ O gestor cria um utilizador com nome, palavra-chave e perfil ☐ Utilizadores duplicados são rejeitados com mensagem de erro ☐ O gestor pode desativar um utilizador, que deixa de poder fazer login ☐ Apenas o perfil Gestor acede a esta opção	Baixa	A definir

Responsáveis: proposta para confirmar na reunião. Dependências: S2-01 primeiro, porque as restantes stories usam a estrutura MVC; S2-02 antes de S2-06 e S2-07; S2-03 orienta S2-04 e S2-05; S2-04 e S2-05 antes de S2-06; S2-06 antes de S2-07.

Detalhes


Data de início	20/10/2026
Data de término	02/11/2026
Tema do sprint	Arranque do projeto: estrutura MVC, base de dados, utilizadores e login por perfil
Meta do sprint	No fim da S2, o projeto tem a estrutura MVC criada e a arrancar em Java, ligada a uma base de dados SQL Server, com login por perfil e validação de entradas consistente, e com o modelo de domínio e o diagrama de classes alinhados com o código, tudo no Trello com estimativas e responsáveis.

Possíveis riscos

Risco	Mitigação
Estrutura MVC mal definida (lógica de negócio nas Views), o que obriga a retrabalho nas próximas sprints.	Fixar a regra de dependências (view → controller → model/DAO) logo na S2-01, rever o código de cada story com outro elemento e validar o diagrama de classes contra o código antes de dar a story por concluída.
Estimativas pouco fiáveis por ser a primeira vez que a equipa estima, sem velocidade de referência.	Planning poker com todos, compromisso conservador com um item extra, e rever a carga a meio do sprint.
Trello desatualizado ou com o Sprint Planning misturado no Product Backlog.	Colunas separadas, estado dos cards atualizado diariamente e meta do sprint fixada no quadro.
Stories dependentes umas das outras (login e menus dependem da estrutura MVC, da base de dados e dos utilizadores) e distribuição desigual de trabalho.	Fechar primeiro a S2-01, trabalhar em par nas stories dependentes (S2-06 com Simão e Guilherme), rever pull requests entre pares e acompanhar os pontos por pessoa.

Recursos de planeamento do sprint

Quadros e retrospetivas de sprint

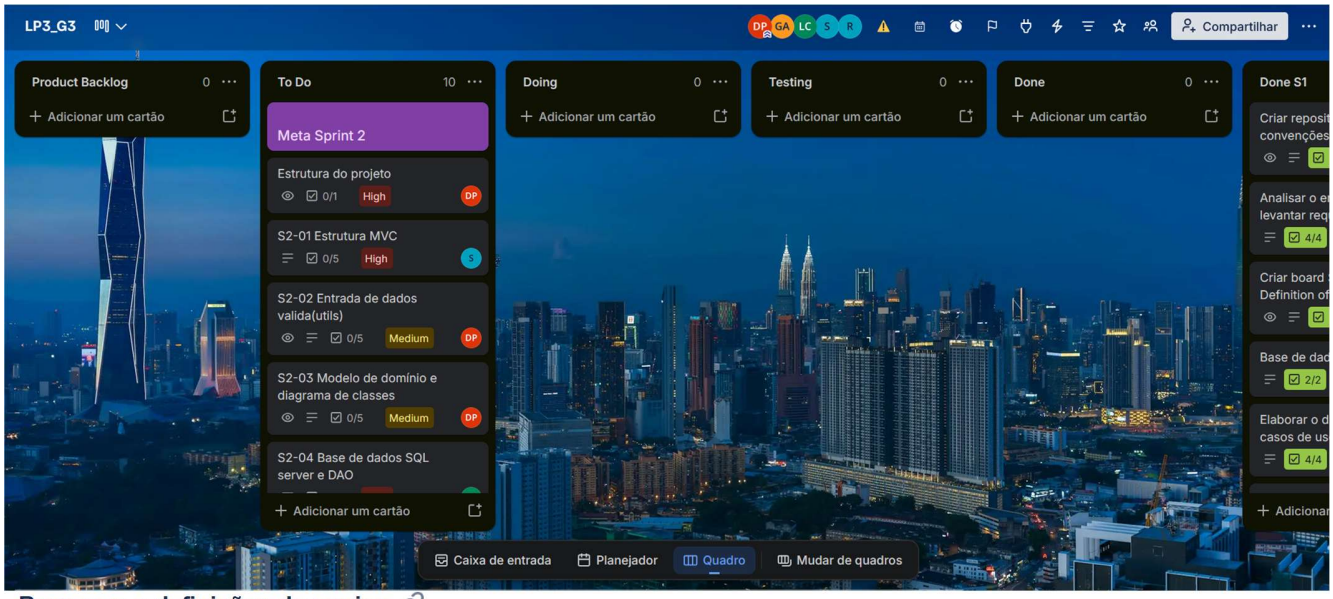

Recursos e definições da equipe
